A&M | PERFORMANCE

Proposta Técnica

Programa AXOL no ONS

TMO com GMO integrado · plano de 6 meses

out/2026

O AXOL muda o trabalho de quem prepara, roda e valida a cadeia, não só o sistema

Trocar sistemas legados por fluxos de execução visuais desloca o trabalho de quem prepara, roda e valida cada rodada. É uma transformação de processos, de papéis e da gestão do custo de execução em cloud.

/Contexto

- O **ONS** adota o **AXOL**, plataforma **low-code** de orquestração visual de rodadas de modelos eletroenergéticos: cada rodada é um **job**, com dados de entrada e parâmetros, organizado em um **fluxo de execução** em cloud com **custo de execução previsível**.
- O AXOL passa a executar a cadeia **NEWAVE → DECOMP → DESSEM**, ligada pelas funções de custo futuro (**FCF**), no lugar de **sistemas legados** atualizados por outras pessoas. O ganho aparece quando quem **prepara, roda e valida** as rodadas troca a execução repetitiva (a mapear no diagnóstico) por validação e decisão.
- **Este não é apenas um projeto de plataforma.** O legado mais difícil de migrar costuma ser o **fluxograma que vive nas pessoas**: sem TMO a entrega tende a atrasar e, sem GMO, o legado tende a não desligar.



Cada elo seguinte consome a FCF do anterior: a ordem de execução é dependência real e, por isso, também a ordem da migração.

Principais desafios

- **Cadeia acoplada pela FCF:** a saída de um modelo alimenta o seguinte; trocar um elo sem reconciliar os demais propaga diferenças.
- **Janelas operativas:** com ciclos mensais, semanais e diários¹, a virada em bloco tende a ser inviável; cada onda exige paralelo, rollback testado e hypercare.
- **Legados e rotinas locais:** regras e ajustes podem viver em sistemas legados e nas rotinas de quem os atualiza¹; fora do fluxo de execução, reaparecem após o corte.
- **Papéis em transição:** quem prepara, dispara e confere rodadas passa a desenhar fluxos de execução, validar e decidir; a habilidade só se prova em rodada real.
- **Custo de execução em cloud:** tende a ser previsível, mas só vira previsão confiável com governança de uso e estimativa por rodada ou fluxograma¹; não se confunde com o CMO nem com a FCF.

Solução esperada

- A A&M atuará como **TMO** (Transformation Management Office, escritório de gestão da transformação) com **GMO** (Gestão de Mudança Organizacional) integrado, sob liderança única, para apoiar o ONS a conduzir a migração da cadeia para o AXOL em um plano de **6 meses** (cronograma a rebaselinar no primeiro quality gate, QG1):


i. Governar ondas, riscos, demandas e custo de execução em uma torre de controle;
ii. Coordenar a migração na ordem da cadeia, com replay, paralelo e rollback testado;
iii. Conduzir a mudança de quem prepara, roda e valida, com prática em rodada real;
iv. Estabilizar com hypercare e definir o critério de saída e a data de desligamento de cada legado;
v. Medir adoção e valor pelos registros de execução do próprio AXOL¹.

1. Premissa a validar no diagnóstico: horizonte e cadência dos modelos, legados e rotinas locais, catálogo de modelos, custo por rodada ou por fluxograma e registros de execução do AXOL. A execução técnica da migração é do time da plataforma e das áreas do ONS. TMO não se confunde com o PMO (Programa Mensal de Operação), do setor elétrico. FCF: função de custo futuro; CMO: custo marginal de operação. NÃO EXAUSTIVO.

Dois cutovers por onda, uma liderança única de TMO e GMO

Em cada onda, dois cutovers (viradas) caem na mesma janela operativa: o do fluxo de execução para o AXOL e o das pessoas para o novo modo de trabalho. Dois líderes tendem a produzir dois cronogramas e um legado que não desliga.



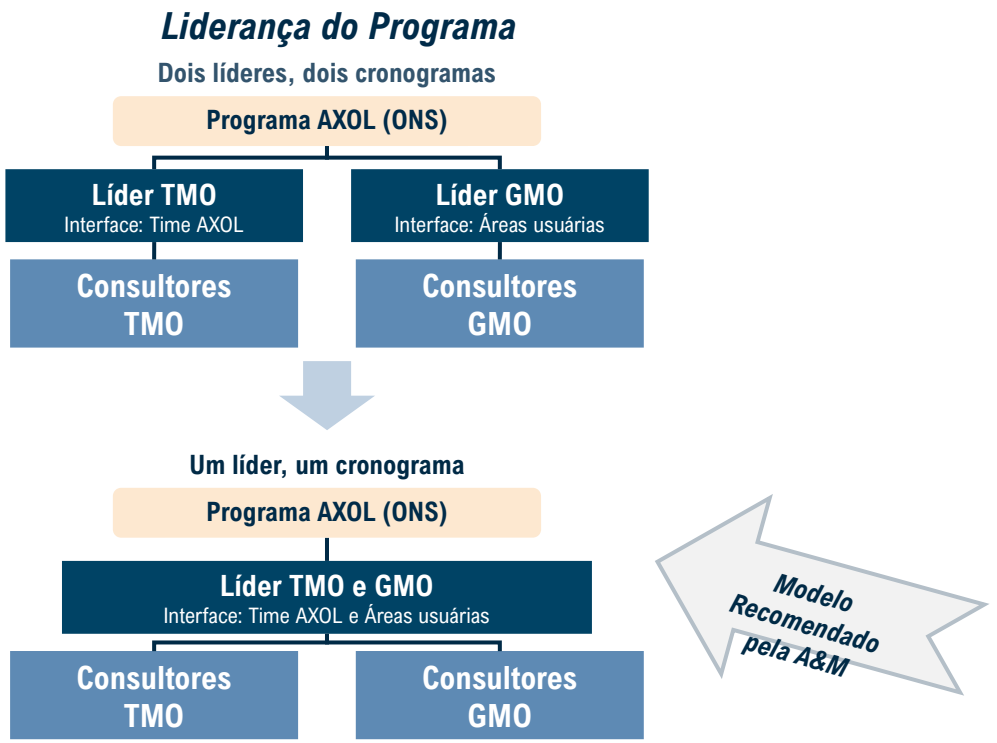

Centralizamos **TMO e GMO** sob um líder porque toda onda tem **dois cutovers na mesma janela operativa**: a virada do **fluxo de execução** para o AXOL e a das **pessoas** para o novo modo de trabalho. Ele leva ao Comitê Executivo **um só Go/No-Go por onda**:

1. **Um cronograma, não dois:** dependências dos fluxos de execução e prontidão das pessoas na mesma torre de controle
2. **Um gate triplo:** equivalência dos resultados, prontidão das pessoas e custo de execução em cloud decididos juntos
3. **Legado com data e dono:** o corte técnico só vale se a rotina local também for retirada
4. **Uma voz** para quem prepara, roda e valida cada rodada, transmitida pelo gestor direto

O ritmo de cada onda é o do critério mais lento do gate triplo: a data é meta, o gate é regra. O valor é medido pelo uso real do AXOL, não por declaração.

TMO: Transformation Management Office, sem relação com o Programa Mensal da Operação. GMO: Gestão de Mudança Organizacional. Premissa a validar: composição da liderança no ONS e interfaces com o time AXOL e as áreas usuárias. Modelo ilustrativo, ajustável à governança do ONS; o cenário de dois líderes é uma alternativa de comparação, não a organização atual do ONS.

A habilidade só se prova em rodada real, sob governança em três níveis

O ADKAR vira o ciclo de cada onda do AXOL: cada passo tem um mecanismo prático e um sinal lido na torre de controle, agregado por equipe e nunca por indivíduo. Três níveis de decisão sustentam o ritmo.

1 MAPEAR → **2 CO-CRIAR** → **3 PRATICAR** → **4 PROVAR** → **5 DESLIGAR**

AWARENESS CONSCIÊNCIA

A mudança começa em **entender o que muda** no trabalho de cada papel



- **Mapa de impactos** por papel (1 a 5): prepara, roda e valida
- **Patrocínio visível** do Comitê Executivo
- Comunicação por onda, **pelo gestor direto**

DESIRE DESEJO

A mudança envolve **decisões pessoais**: o que ganho ao deixar a rotina manual?



- Especialistas **desenham o próprio fluxograma** no AXOL
- **Destino do tempo liberado** a definir com o ONS[1]
- **Pulso de resistência** por perfil

KNOWLEDGE CONHECIMENTO

A mudança exige **saber como**: aprender o AXOL com casos reais



- **Laboratório AXOL** (sandbox): reproduzir um ciclo passado e reconciliar
- **Assistente de IA generativa** sobre manuais aprovados[1]
- **Agentes de mudança** replicam

ABILITY HABILIDADE

A mudança exige **agir**: conduzir uma rodada real dentro da tolerância aprovada



- **Rodada assistida em paralelo** ao processo atual
- Resultado **reconciliado** dentro da tolerância aprovada
- **Placar de ondas** por equipe, sem ranking individual

REINFORCEMENT REFORÇO

A mudança **deve ser reforçada**: o legado só sai com data e dono



- **Legado desligado com data e dono**
- **Reconhecimento** a quem manteve o legado
- Adoção por equipe lida nos **registros do AXOL**[2]

GOVERNANÇA EM TRÊS NÍVEIS, COM UMA TORRE DE CONTROLE ÚNICA

ESTRATÉGICO · Comitê Executivo · quinzenal
Decide o **Go/No-Go de cada onda** e os quality gates (QG1 a QG4); escala riscos e desvios do custo de execução.

TÁTICO · Comitê de Programa · semanal
Lê a **torre de controle** (ondas, riscos, adoção, custo de execução) e prepara as decisões.

OPERACIONAL · Sprints e daily de onda
Quem **prepara, roda e valida** executa replay, paralelo e reconciliação; no hypercare, daily por ciclo.

Fonte: PROSCI, modelo ADKAR (Awareness, Desire, Knowledge, Ability, Reinforcement). Replay: reprodução de um ciclo passado, reconciliada com o resultado histórico. [1] Princípio proposto, a validar com o patrocinador e o RH do ONS; IA generativa só sobre manuais e fluxogramas aprovados, sem executar rodadas oficiais, conforme a política de dados do ONS. [2] Premissa a validar: o AXOL registra uso por fluxograma, equipe e execução; reporte só acima de um tamanho mínimo de grupo, nunca por indivíduo.

ALVAREZ & MARSAL

Ilustrativo

Roadmap de 6 meses: piloto e três ondas na ordem da cadeia de modelos

A ordem segue a FCF e a cadência: o ciclo mensal acumula evidência mais devagar e entra primeiro, com replay histórico; o diário prova em semanas e entra por último*. Cada onda só faz o cutover com o gate triplo verde.

Macro Etapa	1 · PREPARAR — Diagnóstico | Preparação		2 · GESTÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA — Desenho e piloto | Ondas			3 · GO-LIVE & ESTABILIZAÇÃO — Estabilização | Sustentação
	Mês 1 · S1 a S4	Mês 2 · S5 a S8	Mês 3 · S9 a S13	Mês 4 · S14 a S17	Mês 5 · S18 a S22	Mês 6 · S23 a S26
		◆ QG1 · S4	◆ QG2 · S8	◆ QG3 · S15	◆ QG4 · S20	
TMO Governança	**TORRE DE CONTROLE: ondas, riscos, demandas, adoção e custo de execução em cloud, lidos do AXOL***					
	★ Kick-off e linha de base (S1) · RACI e comitês · matriz de riscos · torre no ar (S3)	Comitê Executivo quinzenal e Comitê de Programa semanal	status semanal gerado da torre · sprints e daily de onda	demandas por criticidade, ROI e esforço	Relatório de valor realizado · lições aprendidas · torre transferida ao dono do AXOL · ★ Encerramento	
GMO Pessoas e adoção	**Preparação**	**Desenho e construção**	**Homologação e transição**		**Go-live e hypercare**	
	Assessment de prontidão e linha de base ADKAR ● · mapa de impactos por papel (1 a 5) · plano de mudança e capacitação	Agentes de mudança ativados · fluxogramas-alvo co-criados com quem prepara, roda e valida ★ · Laboratório AXOL aberto (S6)	Trilhas e oficinas por onda · rodada assistida em paralelo · Laboratório AXOL com replay de um ciclo passado reconciliado	assistente de IA** · placar de ondas por equipe · pulso curto antes de cada Go/No-Go ●	Pulso final ● · reconhecimento a quem manteve o legado · comunidade de prática · book da mudança	
ONDAS	**CICLO DE CADA ONDA: Desenho → Replay histórico → Paralelo → ★ Go/No-Go (gate triplo) → Cutover com rollback testado → Hypercare de ao menos um ciclo operativo***					
Onda 0 Piloto		**Desenho** → **Execução** ★	Piloto em fluxograma de menor criticidade, escolhido no QG1: prova o ciclo completo e vira o modelo padrão.			
Onda 1 NEWAVE + FCF			**Desenho** → **Replay** → **Paralelo** ★	**Cutover** → **Hypercare**		
Onda 2 DECOMP + FCF			**Desenho** → **Replay**	**Paralelo** ★ → **Cutover** → **Hypercare**		
Onda 3 DESSEM e demais*			**Desenho**	**Replay** → **Paralelo** ★	**Cutover** → **Hypercare**	
VALIDAÇÃO Técnica e custo de execução	**Critérios de equivalência e ambiente** ★		**Reconciliação, desempenho e custo de execução**		**Operação em regime**	
	Tolerâncias por variável aprovadas por quem valida ★	versões a confirmar* · ambientes cloud segregados e tags de custo de execução	Relatório de reconciliação automático por execução em paralelo · testes de desempenho e volume	estimativa prévia de custo de execução e showback semanal · versões congeladas*	Revisão da política de custo de execução por tipo de rodada · dono de cada fluxograma assume o showback	
CUTOVER Hypercare e legados	**Mapa de legados e rotinas locais**		**Cutover e hypercare por onda**		**Go-live da cadeia e handover**	
	Inventário de legados, rotinas paralelas e conhecimento tácito (S1 a S4)	plano de desligamento por legado aprovado no QG2	Cutover fora dos picos do ciclo · rollback testado, com o processo atual como contingência	SLAs e escala de especialistas · legado em leitura até o aceite	Legado desligado com data e dono após o critério de saída · handover ao dono do AXOL · ★ Encerramento	

◆ Quality Gate: QG1 prontidão · QG2 desenho e piloto aprovados · QG3 Go/No-Go da onda 1 · QG4 Go/No-Go da onda 3 e legados com data ★ Marco ou Go/No-Go de onda ● Pulso ADKAR ↓ FCF do AXOL entra no paralelo seguinte

Gate de onda = equivalência + prontidão + custo de execução em cloud; datas são metas (S1 = início do programa; meses de 4 ou 5 semanas). A FCF do AXOL só vale no paralelo a partir do cutover da onda anterior; antes dele, o paralelo usa a FCF do legado.

* Premissas a validar no diagnóstico (S1 a S4): cadências, ordem e composição das ondas, legados e rotinas locais, catálogo e registros de execução do AXOL, casos históricos para replay, versões dos modelos e fronteiras com outras instituições. ** IA só sobre manuais aprovados, sem executar rodadas oficiais, conforme a política de dados do ONS. A A&M governa e conduz a mudança; a execução técnica é do time da plataforma e das áreas do ONS. Cronograma rebaselinado no QG1.

Torre de controle: o programa é medido por evidência, no AXOL e nas pessoas

Oito indicadores, lidos dos registros do AXOL* e dos pulsos ADKAR: seis alimentam o gate triplo de cada onda e dois medem valor e adoção. Seis riscos de domínio entram na torre com plano de ação desde a primeira semana.

TORRE DE CONTROLE · 8 INDICADORES

EQUIVALÊNCIA · gate técnico

- **KPI 1** **Execuções reconciliadas:** % em paralelo dentro da tolerância e ciclos concluídos contra o mínimo do QG2
- **KPI 2** **Interfaces com outras instituições e versões:** % com acordo operacional e versão congelada*

PRONTIDÃO · gate das pessoas

- **KPI 3** **Prontidão ADKAR:** pulso por perfil (menor elemento) e % de rodadas conduzidas sem apoio
- **KPI 4** **Carga dos especialistas:** horas previstas x realizadas por onda; agenda de validação e janelas operativas

CUSTO DE EXECUÇÃO · gate de cloud

- **KPI 5** **Estimativa prévia:** % dos fluxos de execução oficiais com custo de execução estimado antes de rodar
- **KPI 6** **Realizado x estimado:** desvio do custo de execução em cloud por fluxograma, em showback semanal

VALOR E ADOÇÃO

- **KPI 7** **Execuções oficiais no AXOL:** % por modelo e por semana, lido dos registros, contra o legado*
- **KPI 8** **Legados desligados x planejados**, com data e dono, incluindo rotinas locais retiradas

RISCO	IMPACTO	PLANO DE AÇÃO	KPI
Janelas operativas e virada em bloco	Cutover coincidindo com a janela crítica interrompe ou atrasa um ciclo operativo	**Ondas encadeadas**, execução em paralelo e **rollback testado** por onda; cutover fora do pico; Go/No-Go no Comitê Executivo	**KPI 1, 4**
Resultados diferentes entre o processo atual e o AXOL; versões e interfaces com outras instituições	Validadores perdem a confiança; a reconciliação não termina e a onda trava	**Tolerâncias por variável** antes do paralelo; replay histórico; **versões congeladas**; se parte da cadeia depender de outras instituições, janelas acordadas*	**KPI 1, 2**
Conhecimento tácito e rotinas locais fora do fluxo de execução	A regra não documentada falha após o cutover e a rotina paralela reaparece	Inventário no diagnóstico; o **fluxo de execução vira o registro do conhecimento**, co-criado com quem prepara e roda	**KPI 7, 8**
Capacidade dos especialistas e resistência silenciosa	Quem sustenta o ciclo também valida o AXOL: atraso, fadiga e retorno silencioso ao legado	**Agenda protegida** de validação por onda; agentes de mudança como replicadores; ondas escalonadas pela carga medida nos pulsos ADKAR	**KPI 3, 4**
Adoção parcial: o legado não desliga	Dupla operação, duas fontes de verdade e custo de execução em duplicidade	**Data de desligamento** por legado aprovada no gate; legado em leitura até o aceite; adoção lida nos registros do AXOL; patrocínio ativo do Comitê Executivo	**KPI 7, 8**
Custo de execução em cloud acima do previsto	Perde-se a previsibilidade de custo prometida e surgem cortes de orçamento reativos	**Estimativa prévia** por fluxograma, tags e **showback** semanal antes de qualquer cobrança; alertas de desvio; política por tipo de rodada	**KPI 5, 6**

ENTREGÁVEIS-CHAVE: torre de controle e cronograma integrado · mapa de impactos por papel (1 a 5) e mapa de legados e rotinas locais · critérios de equivalência e plano de ondas · planos de cutover, rollback e hypercare · Laboratório AXOL e plano de capacitação · plano de sustentação e book da mudança

* Premissa a validar: o AXOL expõe registros de execução por fluxograma, modelo, equipe e semana; reporte por equipe acima de um tamanho mínimo de grupo, nunca por indivíduo; interfaces com outras instituições só se parte da cadeia depender delas. Metas, limiares e tolerâncias propostos no QG1 e no QG2 com os validadores e os líderes de área do ONS. NÃO EXAUSTIVO.
